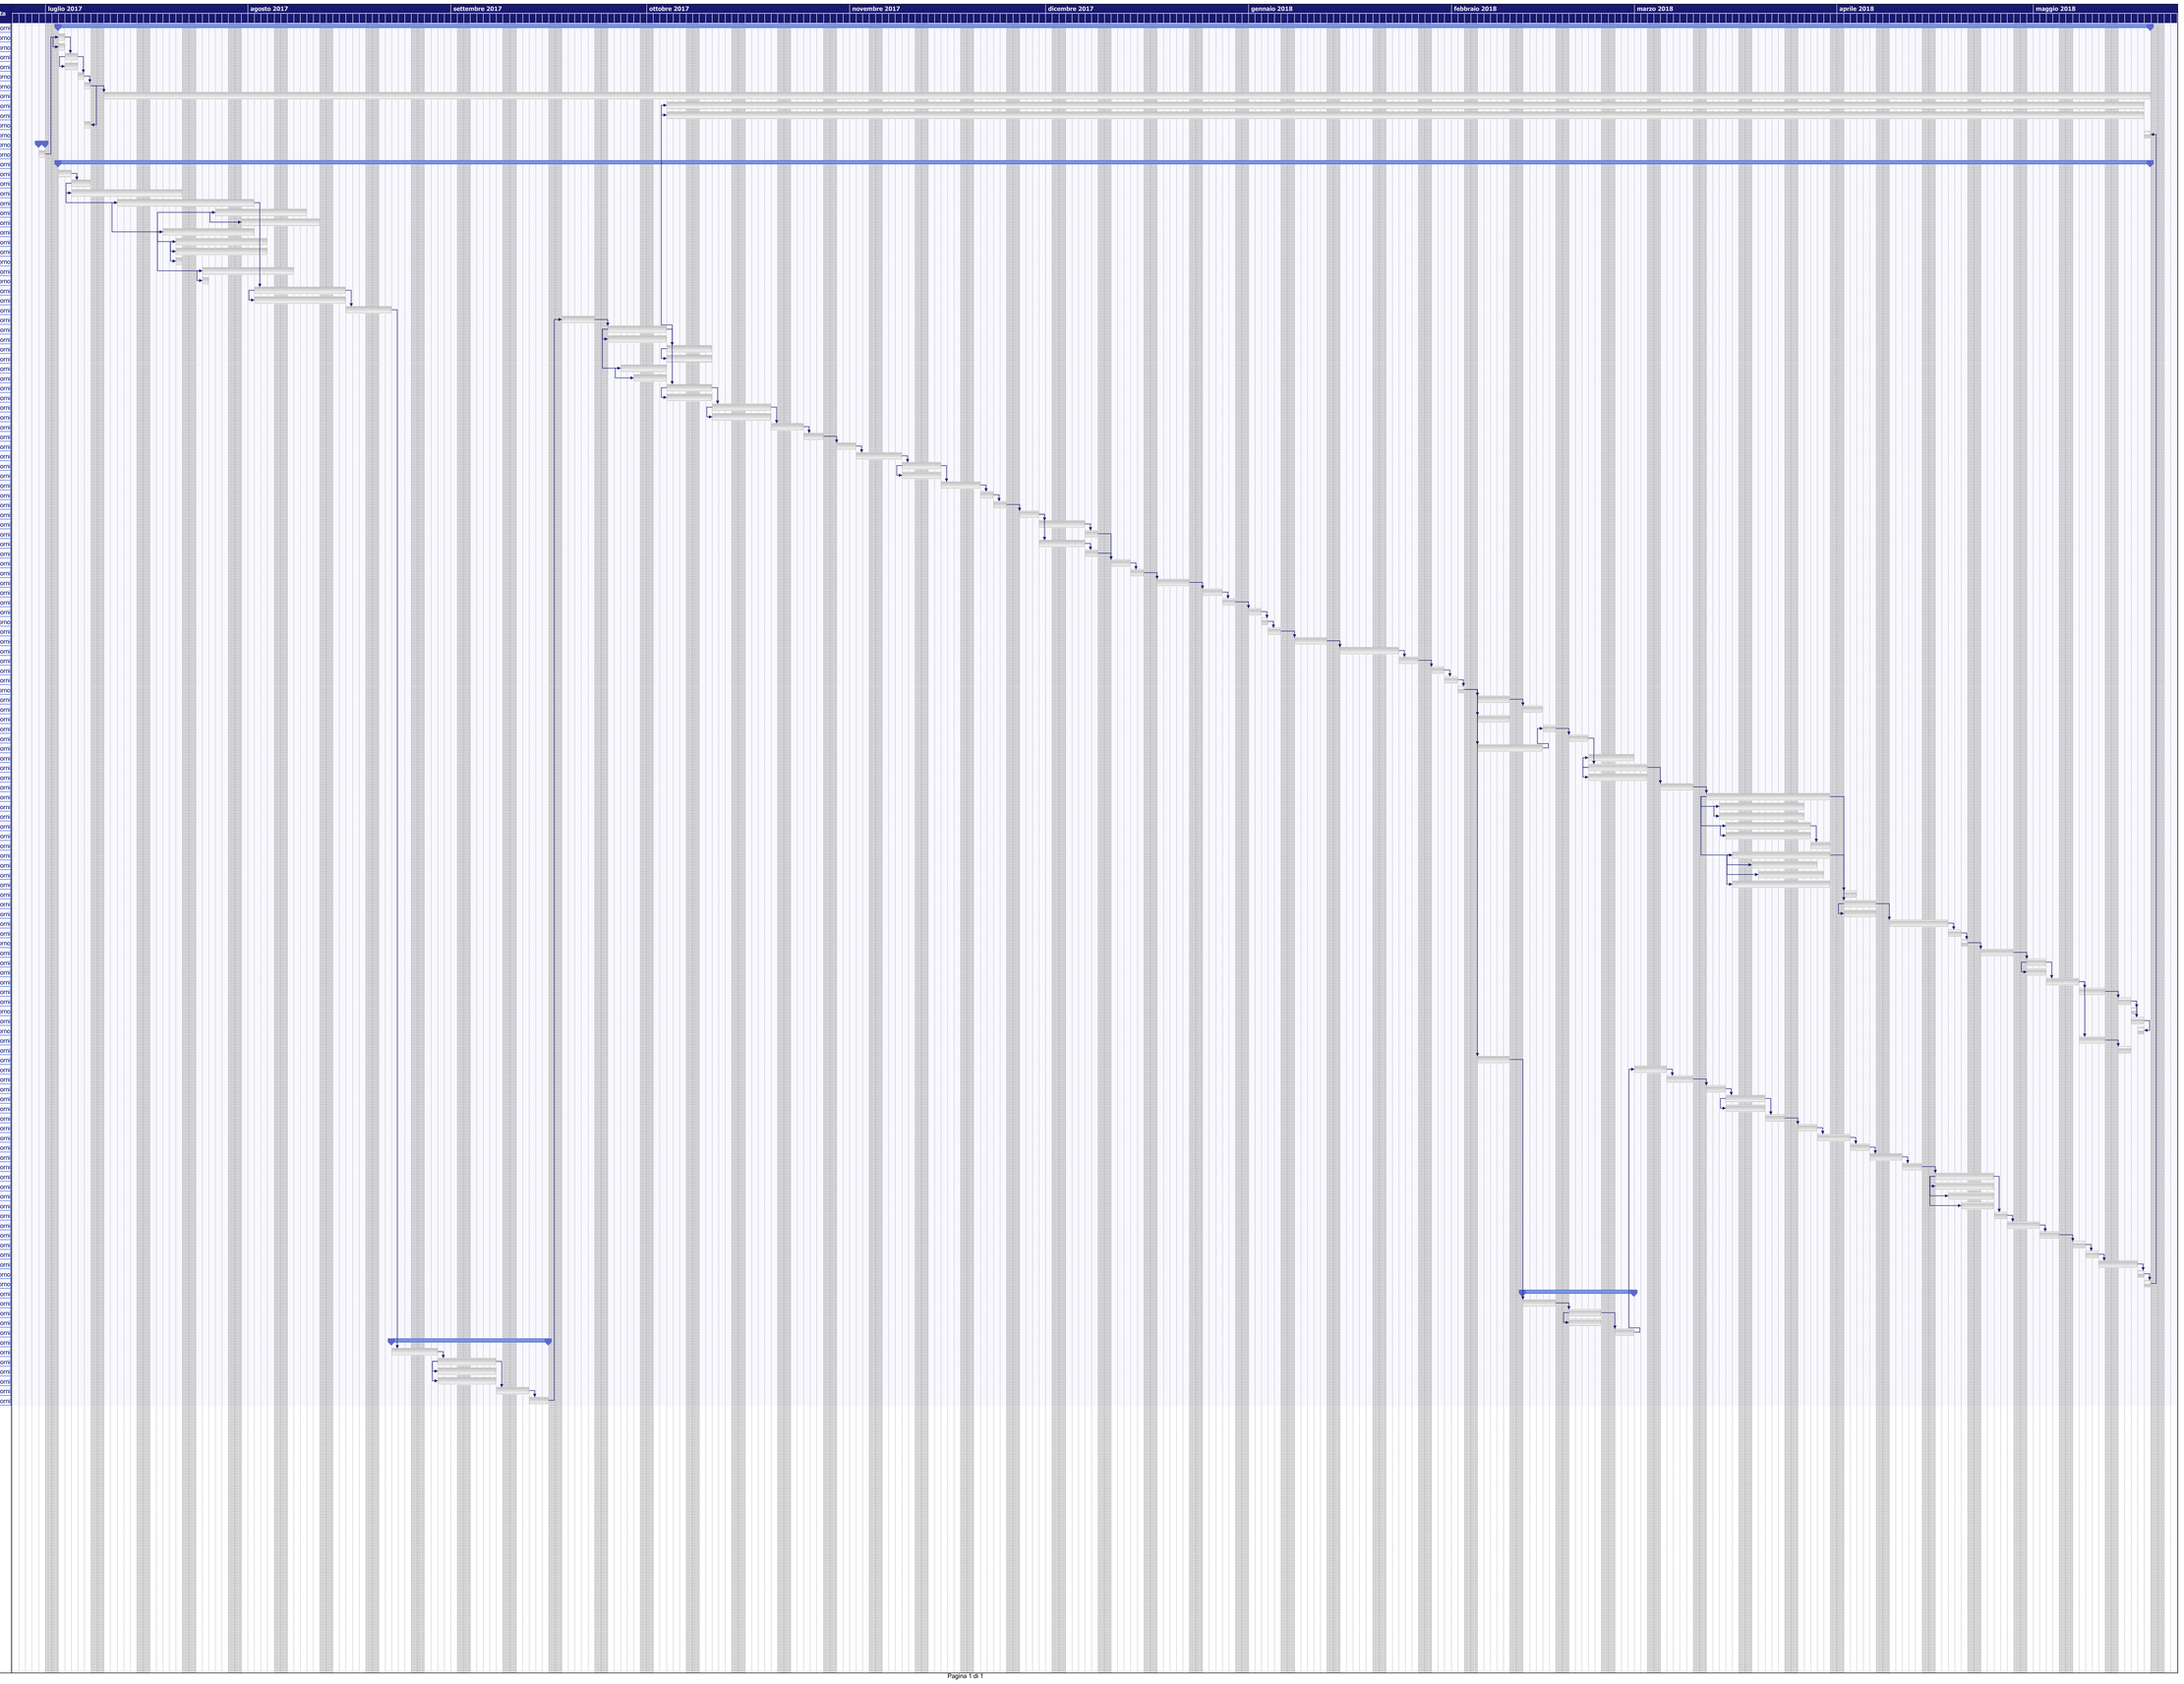| Lavorazione | Durata |
|---|---|
| **F00 - Adeguamento cantiere** | 230 giorni |
| 10 - Delimitazione aree: nastri segn/ barriere mob | 1 giorno |
| 20 - Tracciamenti e preparazione area | 1 giorno |
| 30 - Recinzione cantiere e accessi: pali in legno e rete plastificata... | 2 giorni |
| 40 - Recinzione cantiere: reti / pannelli metallici | 2 giorni |
| 70 - Segnaletica di cantiere | 1 giorno |
| 80 - Baracche di cantiere (box prefabbricati) | 1 giorno |
| 170 - Gru a torre - posizione fissa o su binario | 225 giorni |
| 180 - Uso di ponteggi metallici e non | 162 giorni |
| 190 - ATTREZZATURE DI LAVORO - impiego di ponteggi | 162 giorni |
| 200 - Installazione tettoie di protezione | 1 giorno |
| 220 - Smontaggio impianti attrezzature e op cantiere | 1 giorno |
| **F01 - Lotto Funzionale 1 (Viabilità, Nuovo Templo Crematori...** | 1 giorno |
| 230 - F01 - Lotto Funzionale 1 (Viabilità, Nuovo Templo Cremator... | 1 giorno |
| **F02 - Lotto Funzionale 2 - completamento Nuovo Templo Cre...** | 230 giorni |
| 250 - Demolizione anche parziale di murature di qualsiasi tipo | 2 giorni |
| 260 - Tracciamenti scavi | 3 giorni |
| 270 - Scavi a sezione ampia anche a mano | 13 giorni |
| 280 - Scavi a sezione obbligata anche a mano | 15 giorni |
| 290 - Costruzione di impianto elettrico | 10 giorni |
| 300 - Installaz reti telefoniche | 10 giorni |
| 310 - Posa pozzetti prefabbricati | 10 giorni |
| 320 - Movimentazione e montaggio condotte prefabbricate | 10 giorni |
| 330 - Posa condotte fognanti (escluso scavi) | 10 giorni |
| 340 - Fossa settica cls prefabbricato | 1 giorno |
| 350 - Posa tubazioni idriche | 10 giorni |
| 360 - Posa serbatoi riserva idrica | 1 giorno |
| 390 - Carico o rinterri | 10 giorni |
| 400 - Rilevati con materiale arido e rinterri | 10 giorni |
| 410 - Posa vespai e/o drenaggi in pietrame | 5 giorni |
| 480 - Impermeabilizzazioni | 5 giorni |
| 490 - Carico o rinterri | 7 giorni |
| 500 - Rilevati con materiale arido e rinterri | 7 giorni |
| 510 - Costruzione di impianto elettrico | 5 giorni |
| 520 - Costruzione di impianto di terra | 5 giorni |
| 540 - Canalette di drenaggio e cunette prefabbricate | 5 giorni |
| 550 - Posa impianto d'irrigazione | 3 giorni |
| 560 - Carpenteria in legno | 5 giorni |
| 570 - Carpenteria con uso di pannelli metallici | 5 giorni |
| 580 - Lavorazioni di carpenteria e posa ferro | 7 giorni |
| 590 - Ferro tondo nei casseri | 7 giorni |
| 600 - Fornitura sollevamento e getto cls con pompa | 3 giorni |
| 610 - Impermeabilizzazioni bituminose | 3 giorni |
| 620 - Impermeabilizzazione sintetiche/Barriere al vapore | 3 giorni |
| 630 - Posa tubazioni e/o canalizzazioni fluidi | 5 giorni |
| 640 - Realizzazione di pavimentazione monolitica in cls | 4 giorni |
| 650 - Impermeabilizzazioni con resine e malte speciali | 4 giorni |
| 660 - Vespaio areato con cassoni modulari a perdere | 4 giorni |
| 670 - Rete elettrosaldata | 2 giorni |
| 680 - Massetto in cls confezionato in cantiere | 2 giorni |
| 690 - Carpenteria in legno | 3 giorni |
| 700 - Travi e solai piani ca + laterizi con armatura | 5 giorni |
| 710 - Lavorazioni di carpenteria e posa ferro in quota | 2 giorni |
| 720 - Movimentazione e montaggio solaio prefabbricato | 5 giorni |
| 730 - Rete elettrosaldata | 2 giorni |
| 740 - Sollevamento e getto cls con gru | 3 giorni |
| 750 - Giunti di ripresa del getto e/o dilatazione | 2 giorni |
| 760 - Posa e montaggio strutture portanti in acciaio | 5 giorni |
| 770 - Copertura in pannelli xlam | 3 giorni |
| 780 - Impermeabilizzazione sintetiche/Barriere al vapore | 2 giorni |
| 790 - Impermeabilizzazioni bituminose | 2 giorni |
| 800 - Pannelli isolanti - Lastre - Lucernari | 1 giorno |
| 810 - Massetto sottofondo posa imperm o pav | 2 giorni |
| 820 - Orditura tetti in legno | 5 giorni |
| 830 - Copertura in lastre e pannelli | 7 giorni |
| 840 - Lattoneria | 3 giorni |
| 850 - Montaggio canna fumaria ad elementi modulari | 2 giorni |
| 860 - Installazione di linee vita | 2 giorni |
| 870 - Disarmo e rimozione dei piani di lavoro | 1 giorno |
| 880 - Posa strutture portanti in acciaio | 5 giorni |
| 890 - Montaggio parapetti e ringhiere in metallo | 3 giorni |
| 900 - Costruzione di muratura in blocchi di cls o mattoni | 5 giorni |
| 910 - Pannelli isolanti in lastre | 2 giorni |
| 920 - Trattamento termo-acustico di muri o tramezzi | 3 giorni |
| 930 - Montaggio di facciata continua | 8 giorni |
| 940 - Costruzione di tramezzi in mattoni | 5 giorni |
| 950 - Montaggio di tramezzi in cartongesso | 7 giorni |
| 960 - Montaggio tramezzi in metallo | 7 giorni |
| 970 - Montaggio controsoffitti pannelli gesso/fibra | 5 giorni |
| 980 - Tracce e fori in qualsiasi struttura | 15 giorni |
| 990 - Costruzione di impianto idrico/fognante | 9 giorni |
| 1000 - Rivestimenti isolanti tubazioni idriche | 9 giorni |
| 1010 - Costruzione di impianto a fluido | 9 giorni |
| 1020 - Rivestimenti isolanti tubazioni idriche e termiche | 9 giorni |
| 1030 - Installazione apparecchiature e/o macchine termiche | 3 giorni |
| 1040 - Costruzione di impianto elettrico | 11 giorni |
| 1050 - Costruzione di impianti speciali (citofonici, antintrusione, e... | 8 giorni |
| 1060 - Installaz e/o manut reti telematiche e/o telefoniche | 8 giorni |
| 1070 - Canalizzazioni modulari a vista in PVC o similare | 11 giorni |
| 1090 - Installazione impianto ascensore | 2 giorni |
| 1100 - Posa in opera di intonaco di tipo tradizionale all'interno | 5 giorni |
| 1110 - Utilizzo di malta cementizia | 5 giorni |
| 1120 - Posa pavimenti rivestimenti marmo cotto gres .. | 7 giorni |
| 1130 - Posa in opera di zoccolini e battiscopa | 2 giorni |
| 1140 - Posa pavimenti e rivestimenti scale o rampe | 1 giorno |
| 1150 - Verniciatura e pittura (interno) | 5 giorni |
| 1160 - Posa in opera di intonaco spruzzato in facciata | 3 giorni |
| 1170 - Applicazione prodotti isolanti fissativi o resine in facciata | 3 giorni |
| 1180 - Verniciatura e pittura | 3 giorni |
| 1210 - Montaggio in opera di serramenti di metallo | 4 giorni |
| 1220 - Montaggio di lastre in vetro | 2 giorni |
| 1230 - Installazione antenna TV | 1 giorno |
| 1240 - Installazione apparecchiature elettriche | 2 giorni |
| 1250 - Installaz e/o manut apparecchi illuminanti | 1 giorno |
| 1260 - Montaggio apparecchi tipo split e/o radiatori | 4 giorni |
| 1270 - Montaggio apparecchi sanitari | 2 giorni |
| 1280 - Scavi a sezione obbligata anche a mano | 5 giorni |
| 1330 - Smussi bisellature tori e taglio lastre, cimase, ecc. in pietra | 3 giorni |
| 1340 - Installazione pali di illuminazione | 4 giorni |
| 1350 - Installaz e/o manut app illuminanti in altezza | 3 giorni |
| 1360 - Carico o rinterri | 4 giorni |
| 1370 - Rilevati con materiale arido e rinterri | 4 giorni |
| 1380 - Impermeabilizzazioni bituminose | 3 giorni |
| 1390 - Impermeabilizzazione sintetiche/Barriere al vapore | 3 giorni |
| 1400 - Realizzazione di massetto in cls | 3 giorni |
| 1410 - Rete elettrosaldata | 3 giorni |
| 1420 - Realizzazione di fondazione stradale | 3 giorni |
| 1430 - Posa in opera cordoni zanelle | 3 giorni |
| 1440 - Pavimentazione pietra naturale o cls autobloccanti | 7 giorni |
| 1450 - Movimentazione e posa pavimentazioni in pietra con sollev... | 7 giorni |
| 1460 - Posa pavimentazioni esterne cotto klinker ... | 5 giorni |
| 1470 - Posa pavimentazioni in terra battuta | 3 giorni |
| 1480 - Manutenzione per ripristino parziale manto stradale | 2 giorni |
| 1490 - Preparazione manuale e/o meccanica del terreno | 3 giorni |
| 1500 - Messa a dimora alberi e cespugli con prep. terreno | 3 giorni |
| 1510 - Installazione di elementi arredo urbano | 2 giorni |
| 1520 - Montaggio in opera di cancelli di metallo | 2 giorni |
| 1530 - Recinzione di confine in reti / pannelli metallici | 4 giorni |
| 1540 - Collaudi finali | 1 giorno |
| 1550 - Smontaggio impianti attrezzature e op cantiere | 1 giorno |
| **O01 - OPERE ESTERNE IN C.A.** | 13 giorni |
| 1290 - Carpenteria in legno | 5 giorni |
| 1300 - Lavorazioni di carpenteria e posa ferro | 5 giorni |
| 1310 - Ferro tondo nei casseri | 5 giorni |
| 1320 - Fornitura sollevamento e getto cls con pompa | 3 giorni |
| **O02 - FONDAZIONI ED OPERE DI SOSTEGNO IN C.A.** | 18 giorni |
| 420 - Carpenteria in legno | 5 giorni |
| 430 - Lavorazioni di carpenteria e posa ferro | 7 giorni |
| 440 - Ferro tondo nei casseri | 7 giorni |
| 450 - Rete elettrosaldata | 7 giorni |
| 460 - Fornitura cls su autobetoniera per getto diretto | 3 giorni |
| 470 - Fornitura sollevamento e getto cls con pompa | 3 giorni |
