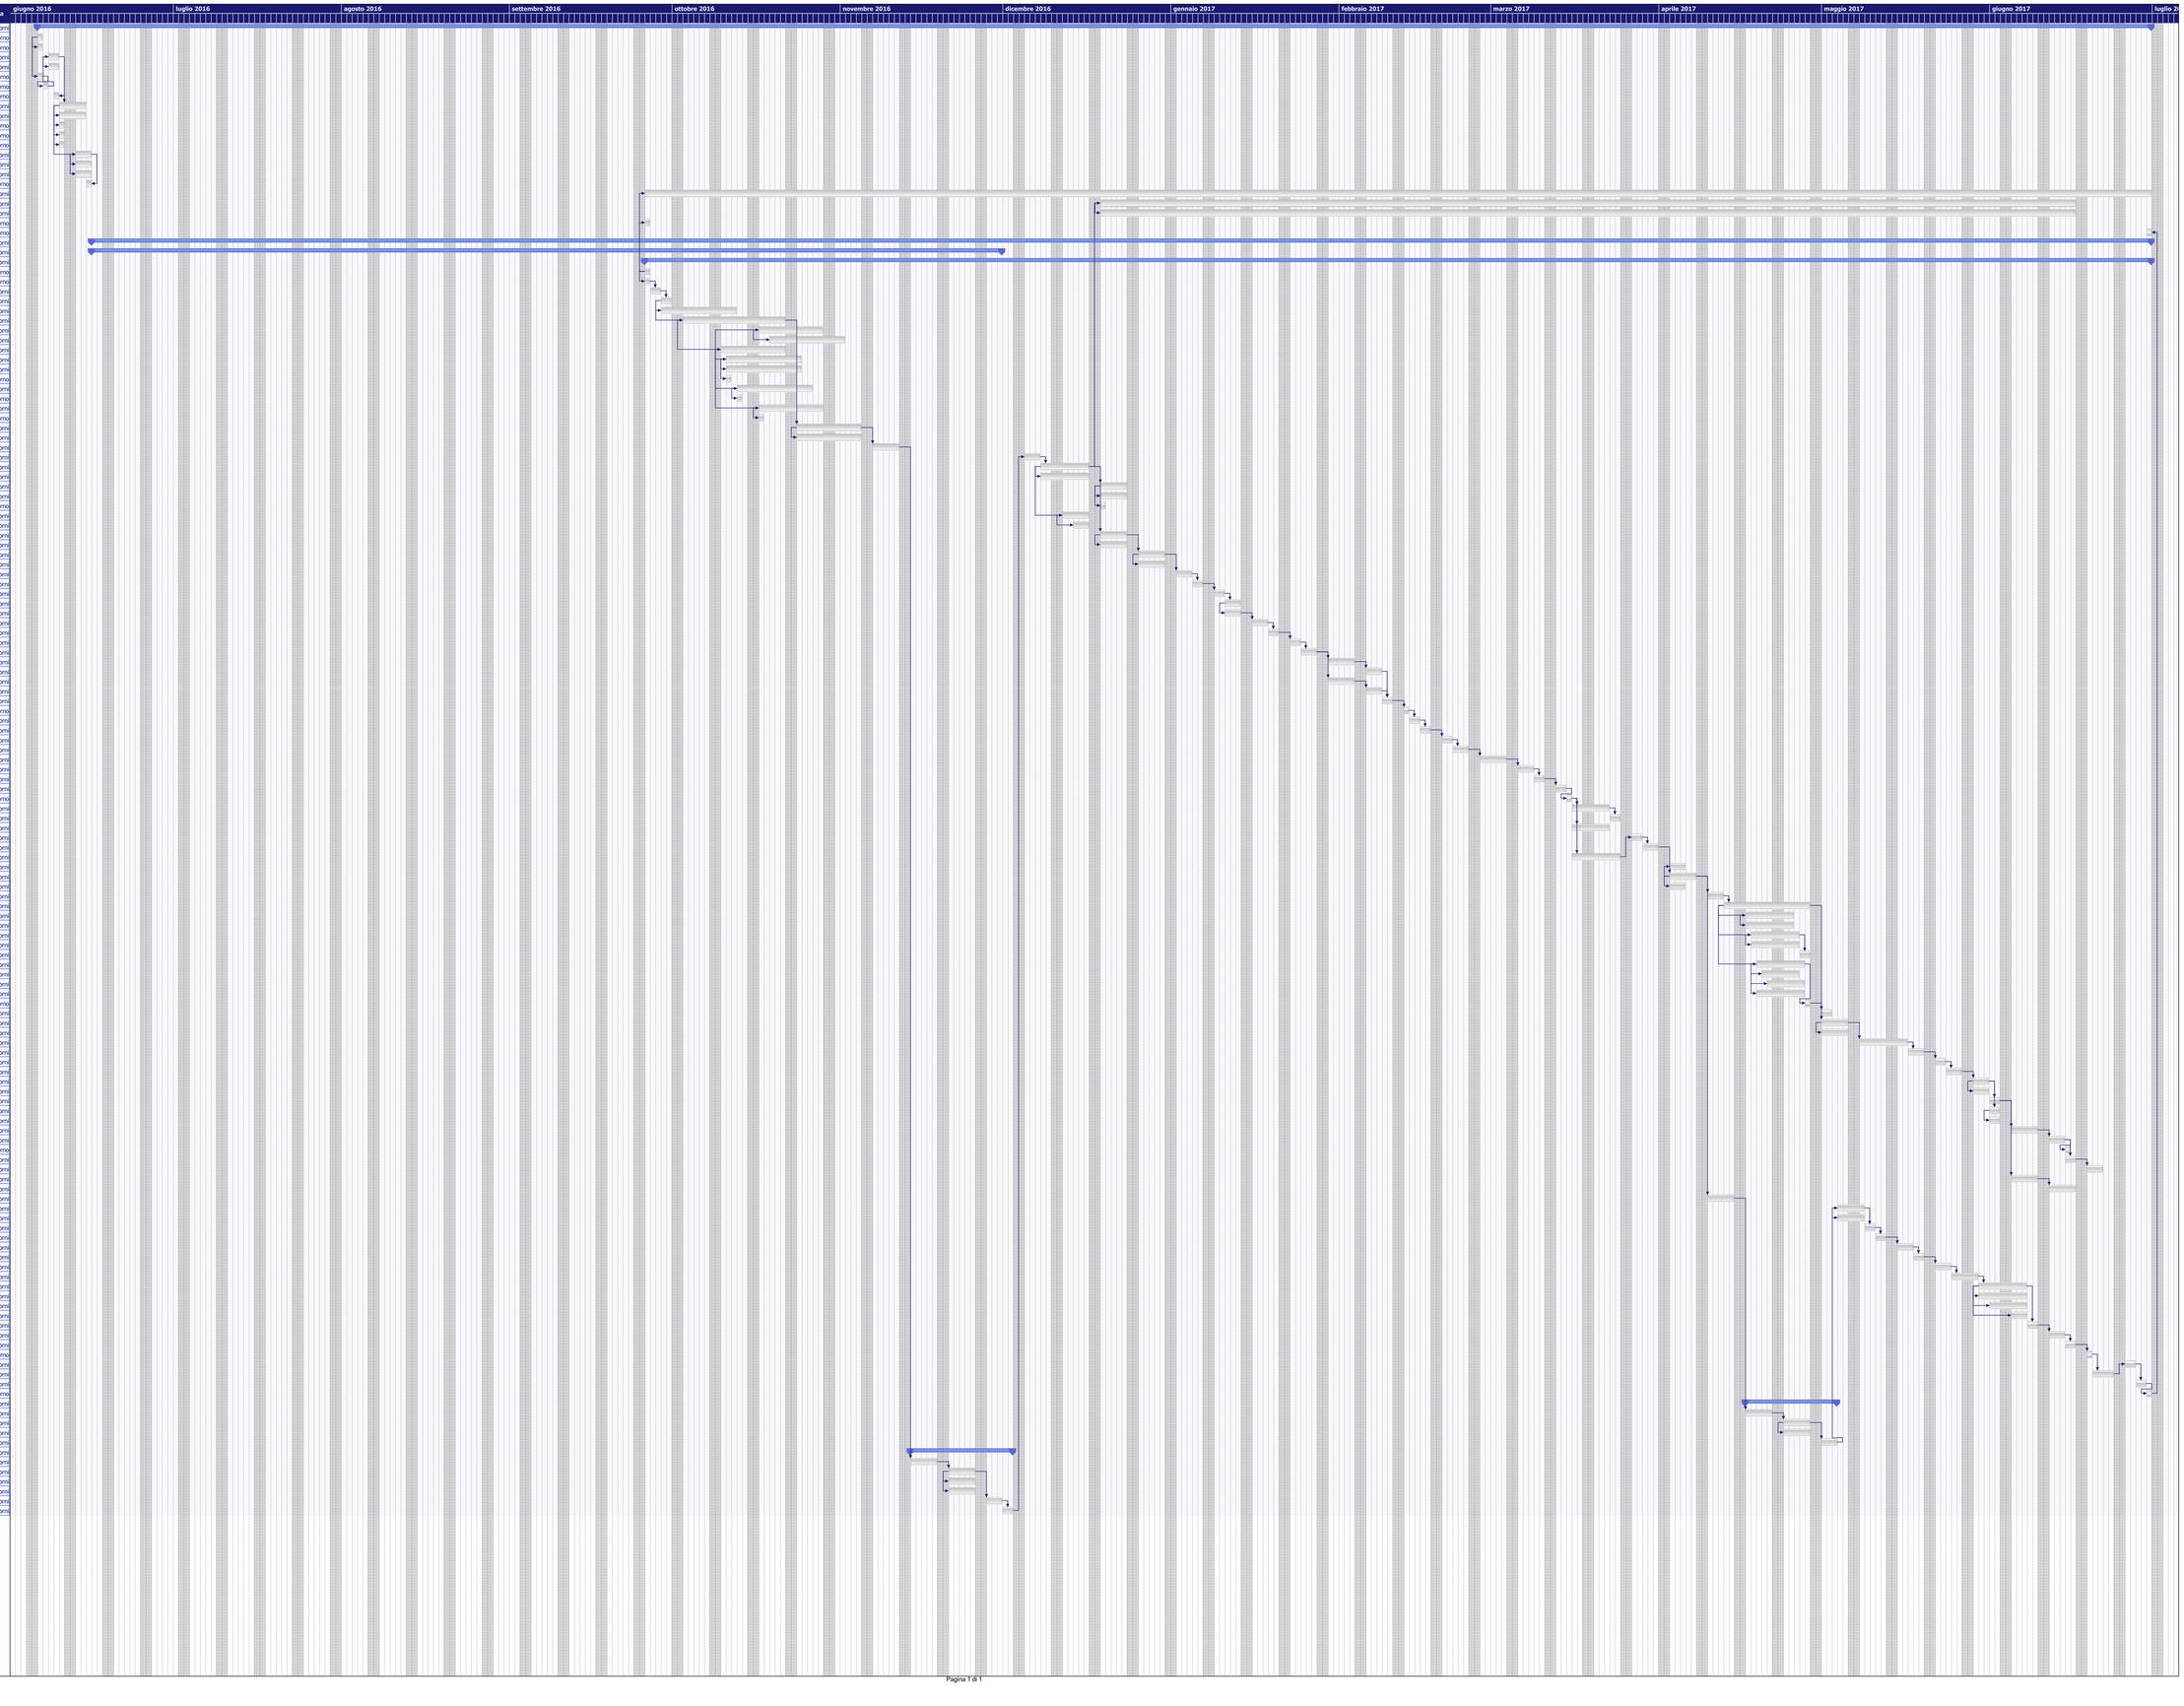Lavorazione	Durata
F00 - Allestimento cantiere	280 giorni
10 - Delimitazione aree: nastri segn/ barriere mob	1 giorno
20 - Tracciamenti e preparazione area	1 giorno
30 - Recinzione cantiere e accessi: pali in legno e rete plastificata...	2 giorni
40 - Recinzione cantiere: reti / pannelli metallici	2 giorni
50 - Taglio vegetazione e decespugliamento	1 giorno
60 - Viabilità di cantiere	1 giorno
70 - Segnaletica di cantiere	1 giorno
80 - Baracche di cantiere (box prefabbricati)	3 giorni
90 - Impianto idrico sanitario di cantiere	3 giorni
100 - Requisiti servizi igienici	1 giorno
110 - Attrezzature di Pronto Soccorso	1 giorno
120 - LAVORAZIONI - organizzazione prevenzione incendi, evacu...	1 giorno
130 - Impianto elettrico di cantiere	3 giorni
140 - Impianto di terra	3 giorni
150 - Impianto protezione scariche atmosferiche	3 giorni
160 - Installazione ed uso di gruppo elettrogeno	1 giorno
170 - Gru a torre - posizione fissa o su binario	200 giorni
180 - Uso di ponteggi metallici e non	130 giorni
190 - ATTREZZATURE DI LAVORO - impiego di ponteggi	130 giorni
200 - Installazione tettoie di protezione	1 giorno
220 - Smontaggio impianti attrezzature e op cantiere	1 giorno
F01 - Lotto Funzionale 1 (Viabilità, Nuovo Tempio Crematori...	272 giorni
M01 - Viabilità	120 giorni
M02 - Nuovo Tempio Crematorio - ala est e Blocco cappel...	200 giorni
230 - Recinzione cantiere e accessi: pali in legno e rete plastif...	1 giorno
240 - Recinzione cantiere: reti / pannelli metallici	1 giorno
250 - Demolizione anche parziale di murature di qualsiasi tipo	2 giorni
260 - Tracciamenti scavi	2 giorni
270 - Scavi a sezione ampia anche a mano	10 giorni
280 - Scavi a sezione obbligata anche a mano	15 giorni
290 - Costruzione di impianto elettrico	10 giorni
300 - Installaz reti telefoniche	10 giorni
310 - Posa pozzetti prefabbricati	10 giorni
320 - Movimentazione e montaggio condotte prefabbricate	10 giorni
330 - Posa condotte fognanti (escluso scavi)	10 giorni
340 - Possa settica cls prefabbricato	1 giorno
350 - Posa tubazioni idriche	10 giorni
360 - Posa serbatoi riserva idrica	1 giorno
370 - Costruzione di impianto a fluido	10 giorni
380 - Cisterna interrata: scavo e posa	1 giorno
390 - Carico o rinterri	10 giorni
400 - Rilevati con materiale arido e rinterri	10 giorni
410 - Posa vespai e/o drenaggi in pietrame	5 giorni
480 - Impermeabilizzazioni	3 giorni
490 - Carico o rinterri	7 giorni
500 - Rilevati con materiale arido e rinterri	7 giorni
510 - Costruzione di impianto elettrico	5 giorni
520 - Costruzione di impianto di terra	5 giorni
530 - Cabina di trasformazione MT-BT	1 giorno
540 - Canalette di drenaggio e cunette prefabbricate	5 giorni
550 - Posa impianto d'irrigazione	3 giorni
560 - Carpenteria in legno	5 giorni
570 - Carpenteria con uso di pannelli metallici	5 giorni
580 - Lavorazioni di carpenteria e posa ferro	5 giorni
590 - Ferro tondo nei casseri	5 giorni
600 - Fornitura sollevamento e getto cls con pompa	3 giorni
610 - Impermeabilizzazioni bituminose	2 giorni
620 - Impermeabilizzazione sintetiche/Barriere al vapore	2 giorni
630 - Realizzazione di pavimentazione monolitica in cls	3 giorni
640 - Impermeabilizzazioni con resine e malte speciali	3 giorni
650 - Vespaio areato con casseri modulari a perdere	3 giorni
660 - Rete elettrosaldata	2 giorni
670 - Massetto in cls confezionato in cantiere	2 giorni
680 - Carpenteria in legno	3 giorni
690 - Travi e solai piani ca + laterizi con armatura	5 giorni
700 - Lavorazioni di carpenteria e posa ferro in quota	3 giorni
710 - Movimentazione e montaggio solaio prefabbricato	5 giorni
720 - Rete elettrosaldata	3 giorni
730 - Sollevamento e getto cls con gru	2 giorni
740 - Giunti di ripresa del getto e/o dilatazione	1 giorno
750 - Impermeabilizzazione sintetiche/Barriere al vapore	2 giorni
760 - Impermeabilizzazioni bituminose	2 giorni
770 - Massetto sottofondo posa impermi o pav	2 giorni
780 - Orditura tetti in legno	3 giorni
790 - Copertura in lastre e pannelli	5 giorni
800 - Lattoneria	3 giorni
810 - Montaggio canna fumaria ad elementi modulari	2 giorni
820 - Installazione di linee vita	2 giorni
830 - Disarmo e rimozione dei piani di lavoro	1 giorno
840 - Posa strutture portanti in acciaio	5 giorni
850 - Montaggio parapetti e ringhiere in metallo	2 giorni
860 - Costruzione di muratura in blocchi di cls o mattoni	5 giorni
870 - Pannelli isolanti in lastre	2 giorni
880 - Trattamento termo-acustico di muri o tramezzi	3 giorni
890 - Montaggio di facciata continua	7 giorni
900 - Costruzione di tramezzi in mattoni	3 giorni
910 - Montaggio di tramezzi in cartongesso	5 giorni
920 - Montaggio tramezzi in metallo	3 giorni
930 - Montaggio controsoffitti pannelli gesso/fibra	3 giorni
940 - Tracce e fori in qualsiasi struttura	12 giorni
950 - Costruzione di impianto idrico/fognante	7 giorni
960 - Rivestimenti isolanti tubazioni idriche	7 giorni
970 - Costruzione di impianto a fluido	7 giorni
980 - Rivestimenti isolanti tubazioni idriche e termiche	7 giorni
990 - Installazione apparecchiature e/o macchine termiche	2 giorni
1000 - Costruzione di impianto elettrico	7 giorni
1010 - Costruzione di impianti speciali (citofonici, antintrusion...	5 giorni
1020 - Installaz e/o manut reti telematiche e/o telefoniche	5 giorni
1030 - Canalizzazioni modulari a vista in PVC o similare	7 giorni
1040 - Installaz e/o manutenzione cabina elettrica	1 giorno
1050 - Installazione impianto ascensore	2 giorni
1060 - Posa in opera di intonaco di tipo tradizionale all'interno	5 giorni
1070 - Utilizzo di malta cementizia	5 giorni
1080 - Posa pavimenti rivestimenti marmo cotto gres ...	7 giorni
1090 - Posa in opera di zoccolini e battiscopa	3 giorni
1100 - Posa pavimenti e rivestimenti scale o rampe	2 giorni
1110 - Verniciatura e pittura (interno)	3 giorni
1120 - Posa in opera di intonaco spruzzato in facciata	3 giorni
1130 - Applicazione prodotti isolanti fissativi o resine in facciata	3 giorni
1140 - Verniciatura e pittura	2 giorni
1150 - Rivestimento facciata in materiali lapidei	2 giorni
1160 - Smussi bisellature tori e taglio lastre, cimase, ecc. in p...	2 giorni
1170 - Montaggio in opera di serramenti di metallo	5 giorni
1180 - Montaggio di lastre in vetro	3 giorni
1190 - Installazione antenna TV	1 giorno
1200 - Installazione apparecchiature elettriche	2 giorni
1210 - Installaz e/o manut apparecchi illuminanti	3 giorni
1220 - Montaggio apparecchi tipo split e/o radiatori	5 giorni
1230 - Montaggio apparecchi sanitari	5 giorni
1240 - Scavi a sezione obbligata anche a mano	5 giorni
1290 - Carico o rinterri	3 giorni
1300 - Rilevati con materiale arido e rinterri	3 giorni
1310 - Impermeabilizzazioni bituminose	2 giorni
1320 - Impermeabilizzazione sintetiche/Barriere al vapore	2 giorni
1330 - Realizzazione di massetto in cls	3 giorni
1340 - Rete elettrosaldata	2 giorni
1350 - Realizzazione di fondazione stradale	3 giorni
1360 - Posa in opera cordoni zanelle	3 giorni
1370 - Pavimentazione pietra naturale o cls autobloccanti	7 giorni
1380 - Movimentazione e posa pavimentazioni in pietra con s...	7 giorni
1390 - Posa pavimentazioni esterne cotto klinker ...	5 giorni
1400 - Posa pavimentazioni in terra battuta	3 giorni
1410 - Manutenzione per ripristino parziale manto stradale	2 giorni
1420 - Preparazione manuale e/o meccanica del terreno	3 giorni
1430 - Messa a dimora alberi e cespugli con prep. terreno	2 giorni
1440 - Installazione di elementi arredo urbano	1 giorno
1450 - Montaggio in opera di cancelli di metallo	2 giorni
1460 - Recinzione di confine in reti / pannelli metallici	4 giorni
1470 - Collaudi finali	2 giorni
1480 - Smontaggio impianti attrezzature e op cantiere	1 giorno
O01 - OPERE ESTERNE IN C.A.	13 giorni
1250 - Carpenteria in legno	5 giorni
1260 - Lavorazioni di carpenteria e posa ferro	5 giorni
1270 - Ferro tondo nei casseri	5 giorni
1280 - Fornitura sollevamento e getto cls con pompa	3 giorni
O02 - FONDAZIONI ED OPERE DI SOSTEGNO IN C.A.	15 giorni
420 - Carpenteria in legno	5 giorni
430 - Lavorazioni di carpenteria e posa ferro	5 giorni
440 - Ferro tondo nei casseri	5 giorni
450 - Rete elettrosaldata	5 giorni
460 - Fornitura cls su autobetoniera per getto diretto	3 giorni
470 - Fornitura sollevamento e getto cls con pompa	2 giorni
